


# 軽米西ソーラー現場状況

2018年11月10日

## 【工事出来高】

- 1. 土木工事  
合計 : 96%
- 2. 据付工事  
合計 : 100%  
パネル据付: 220,416枚
- 3. 電気工事  
合計 : 64%
- 4. 総合計 : 87%

林地開発行為部分完了確認調査は完了済み

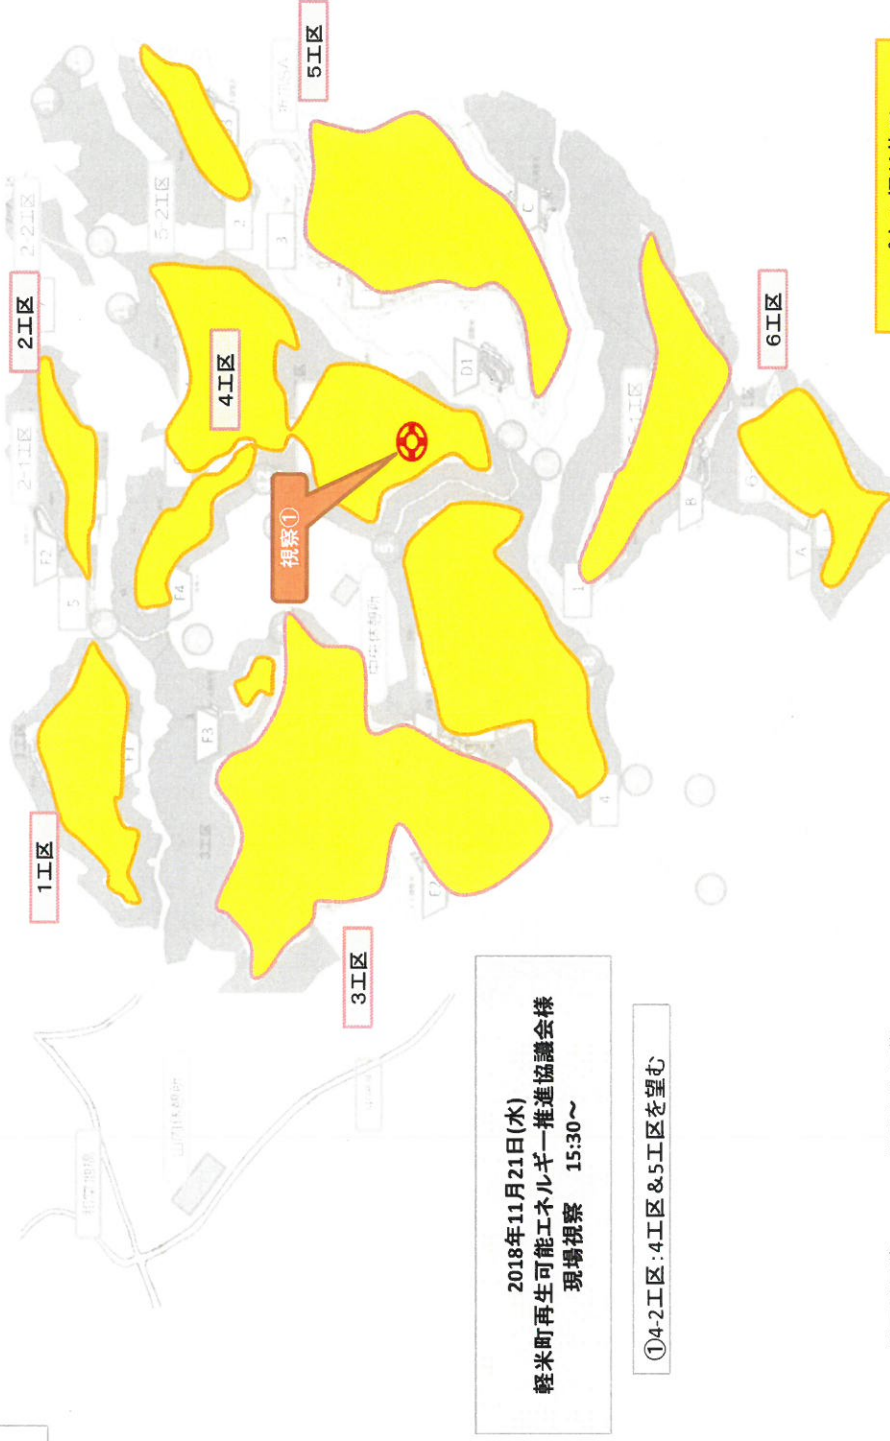

※区域面積:155.1ha、開発行為面積:77.4ha

パネル据付終了

今後の予定	2018年(平成30年)												2019年(平成31年)					
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月		
1. 土木工事																		
①造成・調整池・排水路工事																		
②林地開発行為完了確認調査(事業全体)									★									
③フェンス工事																		
④コンクリート基礎工事																		
2. 据付工事																		
3. 電気工事																		
受電														▶				
引き渡し																▶		
動員	220	260	350	350	350	350	350	300	250	130	30	30	30	15	10	10		
