


# 軽米東ソーラー現場状況

2018年11月10日

## 【工事出来高】

- 1. 土木工事
  - ①伐採工 : 終了
  - ②造成工 : 62%
  - ③調整池工 : 53% (全17ヶ所)
  - ④排水路工 : 73%
  - ⑤道路工 : 67%
  - ⑥フェンス工 : 15%
  - ⑦コンクリート基礎 : 30%
  - ⑧合計 : 66%
- 2. 据付工事
  - 合計 : 6%
- 3. 電気工事
  - 合計 : 24%
- 4. 総合計 : 37.9%

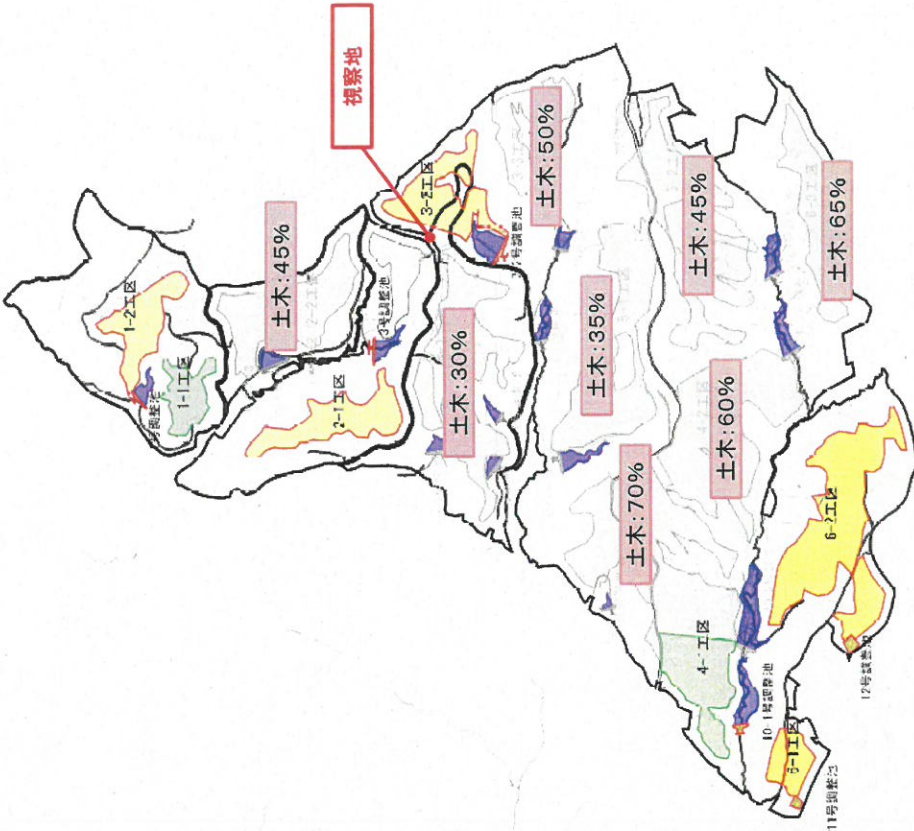

2018年11月21日(水)  
 軽米町再生可能エネルギー推進協議会様  
 現場視察 15:50~

今後の予定	2018年(平成30年)					2019年(平成31年)								
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
マイルストーン														
林地開発行為(部分)完了確認検査(立会)		▶							受電▶					引渡▶
1. 土木工事														
①造成・調整池・排水路工事														
②フェンス工事														
③コンクリート基礎工事														
2. 据付工事(モジュール設置)														
3. 電気工事														
動員	100	150	150	100	50	100	250	350	400	400	450	400	350	50
