

軽米尊坊ソーラー新設工事 進捗状況



2019/12/10 現在

1. 土木工事 合計 : 70%

2. 据付工事 合計 : 2%
 杭打設 : 4% (1,492本 / 37,800本)
 架台組立 : 4% (345アレイ / 9,450アレイ)
 パネル据付 : 2% (3,000枚 / 151,200枚)

3. 電気工事 合計 : 1% (配管布設)

総合計 : 25%

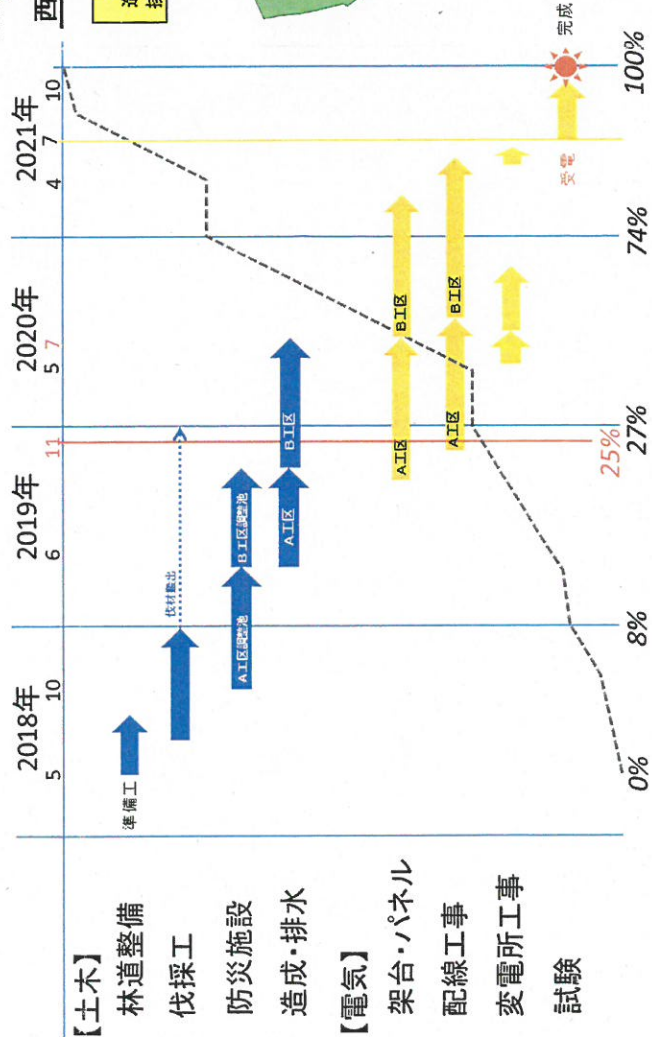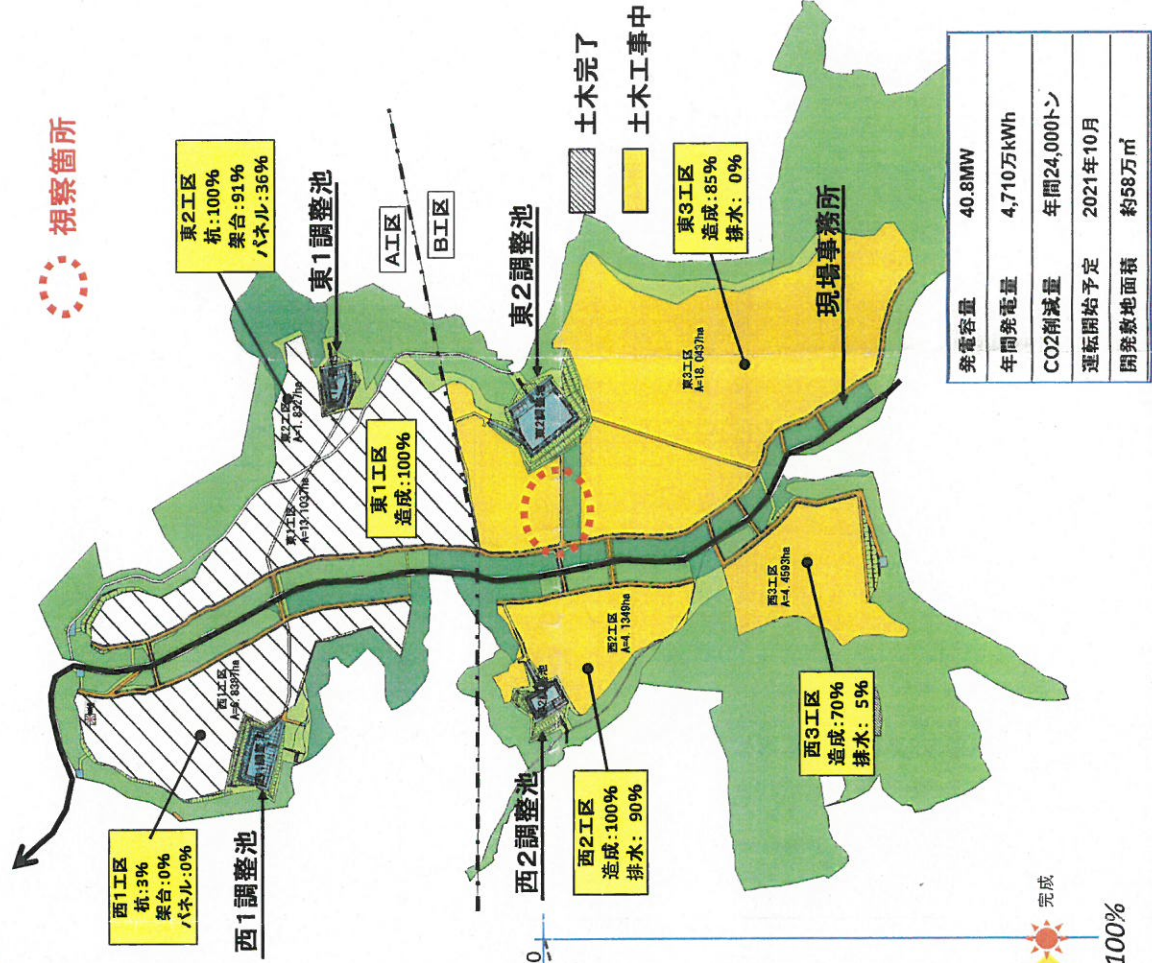

KANDENKO
